

Plan de Comunicaciones y Seguimiento

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-11	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Plan de comunicaciones y seguimiento. Define quién informa qué, a quién, con qué frecuencia y por qué canal, y cómo se compara el avance real con la línea base de plazo y costo para detectar desvíos y actuar a tiempo. Sin datos comparables no hay seguimiento; sin decisiones, el seguimiento se convierte en informe (Unidad 4, §4.1).

1 Interesados y estrategia de comunicación

Registro de Interesados (STK-01 a 07)

ID	INTERESADO	CUADRANTE	ESTRATEGIA (REGISTRO DE INTERESADOS)	QUÉ NECESITA SABER
STK-01	Julio Gutierrez — Sponsor/Cliente	A	Gestionar de cerca	Avance contra hitos, desvíos de plazo y costo, cambios que requieren su aprobación
STK-02	Tomás Disandro — Director y Backend	A	Gestionar de cerca	Todo el estado del proyecto; riesgos y decisiones pendientes
STK-03	Juan Cruz Bulatovich — Frontend	A	Gestionar de cerca	Prioridades, dependencias y cambios que afecten sus módulos
STK-04	Jesús Manuel Martinez — QA/QC	A	Gestionar de cerca	Entregables listos para prueba; criterios de aceptación; defectos
STK-05	Comerciante tipo (usuario final)	C	Mantener informado	Funcionalidad disponible y validación de usabilidad
STK-06	ARCA (organismo fiscal)	B	Mantener satisfecho	Se consulta su documentación y comunicados; no recibe informes del proyecto
STK-07	Railway (infraestructura)	D	Monitorear	Estado del servicio y costos (USD 5/mes)

2 Plan de comunicaciones

Qué · Quién · Cuándo · Cómo

INFORMACIÓN / EVENTO	AUDIENCIA	FRECUENCIA	CANAL	RESPONSABLE	CONTENIDO / SALIDA
Reunión de coordinación	Equipo (STK-02 a 04)	Semanal	Videollamada	Tomás	Avance, bloqueos, riesgos y plan de la semana; acta breve
Informe de estado	Sponsor (STK-01) y equipo	Quincenal (semanal en H2)	Documento en la carpeta de Drive del proyecto	Tomás	Informe de estado (§7): avance, indicadores, riesgos, cambios
Revisión de hito	Sponsor y equipo	Sem. 6, 15, 23 y 27	Reunión + acta de aprobación	Tomás	Verificación de la compuerta del hito (Plan de Calidad §7)
Revisión de riesgos	Equipo	Quincenal (semanal en H2)	Reunión de coordinación	Tomás	Registro de riesgos actualizado (Plan de Riesgos §6)

INFORMACIÓN / EVENTO	AUDIENCIA	FRECUENCIA	CANAL	RESPONSABLE	CONTENIDO / SALIDA
Solicitud de cambio	Sponsor y equipo	Por evento	Registro escrito (Alcance §7)	Quien propone; decide Director o Sponsor	Análisis de impacto y decisión
Demostración y validación	Comerciante tipo (STK-05)	Cierre de H2, H3 y H4	Demostración	Juan	Retroalimentación de usabilidad
Comunicados de ARCA	Equipo	Mensual y al inicio de H2	Sitio oficial de ARCA	Tomás	Cambios normativos o técnicos (riesgo R9)
Defectos y pruebas	Equipo	Semanal	Registro de defectos	Jesús	Estado de pruebas y defectos críticos
Documentación y versiones	Equipo y Sponsor	Por evento	Carpeta de Drive del proyecto	Autor del documento	Versión vigente con control de cambios

Los canales y frecuencias son una propuesta del equipo para validar con el Sponsor en la revisión de H1; no se identificaron herramientas adicionales en la documentación vigente.

3 Indicadores y umbrales de seguimiento

Semáforo

INDICADOR	FÓRMULA / DEFINICIÓN	VERDE	AMARILLO	ROJO	FRECUENCIA
SPI (plazo)	EV / PV	≥ 0,95	0,85–0,94	< 0,85	Semanal
CPI (costo)	EV / AC	≥ 0,95	0,85–0,94	< 0,85	Semanal
Horas reales vs. estimadas por paquete	Horas registradas / horas de la línea base	≤ 105%	106–120%	> 120%	Semanal
Avance de hito	Actividades completas / actividades del hito	Según cronograma	1 semana de atraso	≥ 2 semanas	Semanal
Defectos críticos abiertos	Cantidad	0	1	≥ 2	Semanal
Riesgos de nivel ≥ 12 sin respuesta ejecutada	Cantidad (R1, R2)	0	1	≥ 2	Quincenal
Consumo de reserva	Horas de reserva usadas / 110 h	< 50%	50–80%	> 80%	Mensual

EV (valor ganado) = horas de la línea base de las actividades completadas (criterio 0/100); PV (valor planificado) = horas planificadas hasta la fecha de corte; AC (costo real) = horas registradas por los integrantes a USD 25/h. Umbrales propuestos para validación.

4 Ciclo de seguimiento y escalamiento

Unidad 4 · §4.1


- **Planificar:** qué medir (indicadores de §3) y contra qué (línea base de §5).
- **Medir:** cada integrante registra las horas reales por actividad antes de la reunión de coordinación semanal.
- **Comparar:** plan vs. real vs. previsión; el Director calcula SPI, CPI y desvíos por paquete.
- **Analizar causas y tendencias** cuando un indicador pasa a amarillo; **actuar** (corregir, prevenir o escalar) cuando pasa a rojo.
- **Verificar:** comprobar el efecto de cada acción en la revisión siguiente.
- **Escalamiento:** desvío rojo durante 2 semanas, riesgo materializado con impacto en un hito, o consumo de reserva > 80% → el Director informa al Sponsor y, si corresponde, abre una solicitud de cambio (Alcance §7).

5 Línea base de seguimiento (valor planificado)

Estimación y Presupuesto §6

La línea base de seguimiento es el valor planificado (PV) acumulado por semana, obtenido distribuyendo uniformemente las horas esperadas de cada actividad (Estimación y Presupuesto, §3) sobre sus semanas planificadas (Cronograma, §2). Termina

en 970 h (USD 24.250 = BAC); la reserva de 110 h se gestiona aparte.

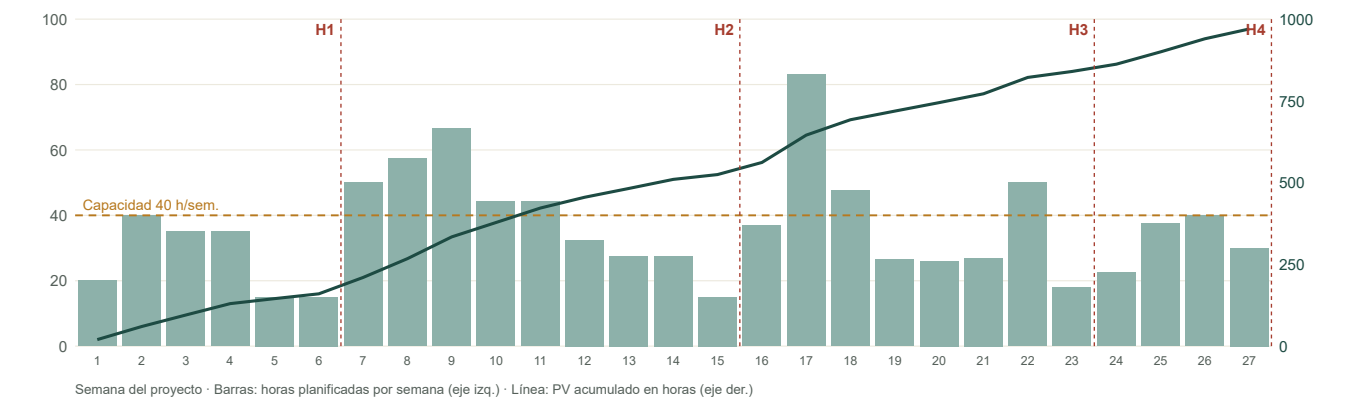

SEM.	PV ACUM.	USD	SEM.	PV ACUM.	USD	SEM.	PV ACUM.	USD
1	20 h	\$500	10	378,3 h	\$9.458	19	719 h	\$17.975
2	60 h	\$1.500	11	422,5 h	\$10.563	20	745 h	\$18.625
3	95 h	\$2.375	12	455 h	\$11.375	21	772 h	\$19.300
4	130 h	\$3.250	13	482,5 h	\$12.063	22	822 h	\$20.550
5	145 h	\$3.625	14	510 h	\$12.750	23	840 h	\$21.000
6	160 h	\$4.000	15	525 h	\$13.125	24	862,5 h	\$21.562
7	210 h	\$5.250	16	562 h	\$14.050	25	900 h	\$22.500
8	267,5 h	\$6.688	17	645 h	\$16.125	26	940 h	\$23.500
9	334,2 h	\$8.354	18	692,5 h	\$17.312	27	970 h	\$24.250

6 Acciones correctivas		Ficha de acción verificable
CAMPO	CONTENIDO	
Desviación	Qué indicador se alejó del objetivo	
Causa raíz	Por qué ocurrió	
Acción	Qué se hará y desde cuándo	
Responsable	Persona asignada	
Fecha objetivo	Cuándo se espera el efecto	
Indicador de verificación	Cómo se sabrá que funcionó	
Seguimiento	Mantener, modificar o escalar	

Ejemplo verificable (basado en el análisis de carga del Cronograma, §5):

CAMPO	CONTENIDO
Desviación	La demanda semanal planificada llega a 83 h en la semana 17 frente a una capacidad de 40 h.
Causa raíz	Las actividades 5.x, 6.x y 3.x se programaron en paralelo al inicio de H3.
Acción	Nivelar la carga desplazando actividades con holgura (6.1.x y 6.2) dentro de su holgura total, sin mover los hitos.
Responsable	Tomás Disandro, con Juan Cruz Bulatovich
Fecha objetivo	Antes del inicio de la semana 16 (30/11/2026)

CAMPO	CONTENIDO
Indicador de verificación	Carga semanal planificada ≤ 50 h en todas las semanas de H3
Seguimiento	Revisar en la reunión de coordinación de la semana 15

7 Informe de estado

Contenido mínimo

- **Resumen:** estado general (verde/amarillo/rojo) y logros del período.
- **Avance:** actividades completadas y en curso; avance del hito vigente.
- **Indicadores:** SPI, CPI, horas reales vs. línea base, defectos críticos, consumo de reserva.
- **Riesgos e incidentes:** cambios en el registro y estado de las respuestas.
- **Cambios:** solicitudes abiertas y resueltas (Alcance §7).
- **Decisiones requeridas** del Sponsor y próximos pasos.

8 Datos históricos y calibración

- Registrar al cierre de cada hito el tamaño y el esfuerzo estimado y real por paquete.
- Calcular el error relativo $|\text{real} - \text{estimado}| / \text{real}$ y analizar el sesgo (¿se subestima o se sobreestima?).
- Conservar los datos como histórico del equipo y las lecciones aprendidas al cierre (9.4) para calibrar futuras estimaciones.
